



MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL CONCESIÓN NORTE - NOVIEMBRE DE 2022



EMPRESA TITULAR: GASES DEL PACÍFICO S.A.C.

PERFIL DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en brindar el servicio de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en las áreas de concesión, que son:

- Chimbote
- Chiclayo
- Trujillo
- Huaraz
- Cajamarca
- Lambayeque
- Pacasmayo

INFRAESTRUCTURA:

Transporte terrestre de Gas Natural Licuefactado (GNL) - Desde el Punto de Suministro (Estación de Carga Perú LNG).


Estaciones de Distrito - Incluyen un sistema de recepción, almacenamiento y regasificación de GNL, además de las estaciones de regulación, medición y odorización.

Sistema de Distribución de Gas Natural - Por red de ductos, para suministrar a los usuarios finales.

DATOS DEL CONTRATO

FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE FIRMA (CIERRE)	POC	PLAZO DE LA CONCESIÓN	INVERSIÓN ESTIMADA	OPERADOR CALIFICADO
25 julio 2013	31 octubre 2013	07 diciembre 2017	19 años desde la POC	USD 62,3 MM	Promigas S.A. ESP

Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión Norte

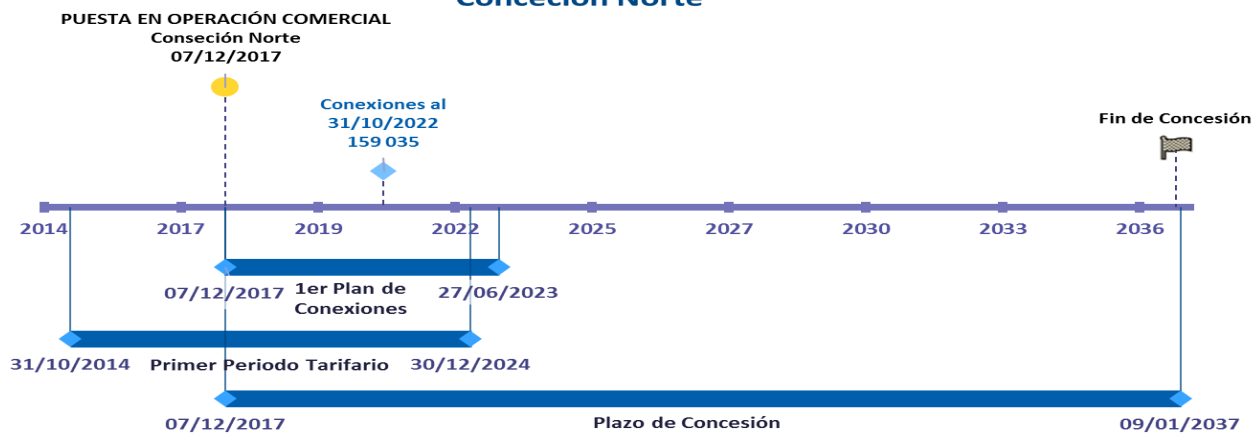

* Fecha de término del 1er Plan de Conexiones considera un periodo de suspensión por Fuerza Mayor de 169 días calendario otorgado por el Concedente, por el Estado de Emergencia Nacional; así como, un plazo de suspensión de 34 días calendario por la interrupción del suministro de GNL en el cargadero de la empresa PERU LNG S.R., entre el 28 de abril al 31 de mayo de 2021. La localidad de Cajamarca cuenta con un plazo adicional de 31 días calendario por evento climatológico.

MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL CONCESIÓN NORTE - NOVIEMBRE DE 2022

HITOS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓN

- **Febrero 2015:** Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)
- **30.07.2015:** Aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
- **31.07.2015:** Manual de Diseño, Programa de Gestión de Calidad y Manual de Construcción
- **Octubre 2015:** Estudio de Riesgos
- **30.09.2016:** Aprobación DIA – Huaraz

CONSTRUCCIÓN

- **05.09.2015:** Inicio de las actividades de construcción del Sistema de Distribución de Gas Natural, con la construcción de las Estaciones de Distrito.
- **20.02.2017:** Proyecto Complementario, Estación de Carga de GNL (Planta Melchorita): Perú LNG posterga nuevamente la fecha de inicio de la primera carga de camiones programada para el día 27.10.2017.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

OBLIGACIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN
Estados financieros auditados anual y trimestrales	✓ 19.04.2022: Presentó los estados financieros del año 2021.
	✓ 31.10.2022: Presentó los estados financieros al tercer trimestre del año 2022.
Renovación de Garantía de Fiel Cumplimiento	✓ 21.09.2021: Remite renovación la garantía de fiel cumplimiento vigente hasta el 22 de octubre de 2023
Régimen de Seguros, el concesionario debe presentar la relación de seguros tomados y/o mantenidos	✓ 28.01.2022: Presentó información con los seguros tomados y/o mantenidos por Quavii
Inventario de Bienes de la Concesión	✓ 31.03.2022: Presentó a Osinergmin y al Concedente el inventario de los Bienes de la concesión correspondiente al ejercicio 2021.
Remisión y/o publicación en la web de los contratos de Servicio de Distribución suscritos con los Usuarios de la Red	✓ 10.10.2022: Presentó la relación de contratos de servicio de distribución suscritos con los usuarios del mes de setiembre 2022.
	✓ 14.11.2022: Presentó la relación de contratos de servicio de distribución suscritos con los usuarios del mes de octubre 2022.
Relación de usuarios que han cancelado o han realizado adelantos de su margen por promoción	✓ 10.10.2022: Presentó la relación de usuarios que han cancelado o han realizado adelantos de su margen por promoción setiembre 2022.
	✓ 10.11.2022: Presentó la relación de usuarios que han cancelado o han realizado adelantos de su margen por promoción octubre 2022.
Informar respecto a la disponibilidad del Sistema de Distribución	✓ 11.10.2022: Informó que no ocurrieron paros no programados correspondiente al mes de setiembre de 2022
	✓ 18.11.2022: Informó que no ocurrieron paros no programados correspondiente al mes de octubre de 2022
Número de consumidores y volúmenes de ventas por categoría tarifaria	✓ 10.10.2022: Presentó la información de número de consumidores y volúmenes de ventas de gas natural por categoría tarifaria al mes de setiembre 2022.
	✓ 10.11.2022: Pendiente de prentar la informacion de número de consumidores y volúmenes de ventas de gas natural por categoría tarifaria al mes de octubre 2022.
Registro del número de consumidores conectados sin beneficio	✓ 13.10.2022: Presentó el registro del número de consumidores conectados sin beneficio de setiembre de 2022.
	✓ 10.11.2022: Presentó el registro del número de consumidores conectados sin beneficio de octubre de 2022.

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PROYECTO

- Mediante Informe Legal N° 011-2017-MEM/DGH-DNH-DGGN de fecha 23 de marzo de 2017 se amplía el plazo de suspensión hasta el 26 de julio de 2017.
- Shell GNL Perú S.A.C., mediante Carta PLNG-GM-0228-17, de fecha 28 de agosto de 2017, comunica a Osinergmin la postergación de la primera carga de camiones programada para el día 29.08.17.
- Shell GNL Perú S.A.C., comunicó el programa de carga de camiones de GNL a realizarse el 27 de octubre de 2017 (02 camiones) y el 31 de octubre de 2017 (02 Camiones).

MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL CONCESIÓN NORTE - NOVIEMBRE DE 2022

- Mediante RCD N° 226-117-OS/CD, publicada el 15.12.2017, se exceptuó hasta el 23 de enero de 2018, a la empresa PERÚ LNG, de la obligación de inscripción en el Registro de Hidrocarburos como Operador de Estación de Carga de GNL.
- Gases del Pacífico ha publicado los pliegos tarifarios aplicables desde noviembre de 2017 en su página web.
- Mediante RCD N° 015-2018-OS/CD, publicada el 10.02.2018, se exceptuó hasta el 31 de marzo de 2018, a la empresa PERÚ LNG, de la obligación de inscripción en el Registro de Hidrocarburos como Operador de Estación de Carga de GNL.
- La empresa Perú LNG S.R.L. desde el 05 de abril de 2018 se encuentra inscrita en el Registro de Hidrocarburos como Estación de Carga de GNL y Operador de Estación de Carga de GNL, a través de los registros N° 135329-613-040418 y N° 109219-654-040418, respectivamente.
- Mediante RD N° 105-2018-MEM/DGH, del 19 de junio de 2018, la DGH autorizó a GDP realizar pruebas que permitan verificar la viabilidad del uso de una unidad móvil (Microfueler) para el abastecimiento de Gas Natural Licuefactado (GNL) a los vehículos automotores que conforman el gasoducto virtual de la Concesión Norte.
- Mediante informes semanales la concesionaria comunica que realiza el control y monitoreo de variables de proceso a sus siete (07) Estaciones de Distrito (Trujillo, Chiclayo, Lambayeque, Pacasmayo, Chimbote, Cajamarca y Huaraz).
- Mediante Oficio N° 1330-2019-MINEM/DGH de fecha 06.12.2019, la DGH remite el Informe Técnico Legal N° 89-2019-MINEM/DGH-DNH -DGGN, a través del cual efectúa una suspensión del plazo el cumplimiento de la meta de conectados en Huaraz por el plazo de 106 días calendario, contados a partir del día siguiente de notificado el referido informe, es decir, hasta el día 21.03.2020. Posteriormente, mediante Informe Técnico Legal N° 70-2020-MINEM/DGH-DNH-DGGN, la DGH amplió el plazo antes indicado en 90 días calendario, es decir, hasta el día 04.12.20.
- Mediante Carta GDP-COM-S-2020-00970 de fecha 16 de marzo de 2020, Gases del Pacífico solicitó a la DGH la calificación de la situación de emergencia como Fuerza Mayor por el periodo de duración del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, y las prórrogas que hubiere, solicitud que fue reiterada mediante Carta GDP-COM-S-2020-00970, de fecha 18 de marzo de 2020. Al respecto, mediante Informe Técnico Legal N° 0031-2020-MINEM/DGH-DGGN-DNH, la DGH concede la Fuerza Mayor solicitada por Gases del Pacífico, respecto a las obligaciones contractuales relacionadas al Primer Plan de Conexiones, durante el plazo de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional desde el 16 de marzo hasta el 12 de abril de 2020. Posteriormente, mediante Informe Técnico Legal N° 0060-2020-MINEM/DGH-DGGN-DNH, la DGH otorga la ampliación de Fuerza Mayor solicitada por un plazo de 140 días calendario, desde el 13 de abril hasta el 30 de agosto de 2020.
- Mediante Carta S/N de fecha 28 de abril de 2021, Gases del Pacífico invocó Fuerza Mayor debido a la interrupción del suministro de GNL en el cargadero de la planta de Pampa Melchorita de PERU LNG S.R.L., solicitud que fue reiterada mediante Carta S/N de fecha 11 de mayo de 2021 y adjunta informe sustentatorio mediante Carta S/N de fecha 26 de julio de 2021. Al respecto, mediante Informe Técnico Legal N° 259-2021-MINEM/DGH-DGGN-DNH, la DGH concede la Fuerza Mayor solicitada por Gases del Pacífico, y concede la suspensión del plazo del Contrato de Concesión, por un periodo de treinta y cuatro (34) días calendario, desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo de 2021. Asimismo, mediante Oficio N° 1927-2021-MINEM/DGH de fecha 28 de octubre de 2021, la DGH indica que durante el plazo antes indicado no resulta exigible al concesionario el cumplimiento de lo previsto en el Contrato de Concesión, lo que incluye las obligaciones relacionadas al Primer Plan de Conexiones.
- Mediante Carta S/N de fecha 29 de marzo de 2021, Gases del Pacífico solicitó la suspensión de obligaciones relacionadas al cumplimiento del Primer Plan de Conexiones en la localidad de Cajamarca, por evento climatológico ocurrido en el mes de marzo de 2021. Al respecto, mediante Informe Técnico Legal N° 256-2021-MINEM/DGH-DGGN-DNH, de fecha 30 de setiembre de 2021, el Concedente otorga la suspensión de la obligación del Primer Plan de Conexiones previsto para el año 2021 en Cajamarca, por un periodo de treinta y un (31) días calendario.
- Mediante Oficio N° 903-2021-OS-DSGN de fecha 17 de diciembre de 2021, Osinermin remite el Informe N° 489-2021-OS-DSGN/UIGN, con los resultados de la fiscalización sobre el cumplimiento de las metas previstas para el Año 3 del Primer Plan de Conexiones, concluyendo que la Sociedad Concesionaria supera el número total de Consumidores Conectados correspondientes al año 3, así como las metas parciales por localidad.
- En construcción dos Estaciones de Descompresión de GNC en las Estaciones de Distrito de Trujillo y Chiclayo, con capacidad de 4 000 Sm³/hr y 6 000 Sm³/hr, respectivamente. Asimismo, se viene construyendo dos Estaciones de Servicio de GNL, una en Trujillo-Moche y otra en Lambayeque con tanques de almacenamiento de GNL de 30 m³ y 23m³, respectivamente.

REGISTROS ESTADÍSTICOS

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y ESTACIONES DE DISTRITO

CONCESIÓN NORTE - GASES DEL PACIFICO (GDP)


INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y DE ESTACIONES DE DISTRITO

Ítem	Ciudad	Inicio de Construcción de Estaciones de Distrito	% de Avance de Estaciones de Distrito	Inicio de construcción de Redes	Avance de Construcción de Redes [m] (*)
1	Cajamarca	21/12/2015	100%	Febrero/2017	379 897,84
2	Lambayeque	12/09/2015	100%	Setiembre/2017	144 083,45
3	Chiclayo	12/09/2015	100%	Setiembre/2017	842 199,81
4	Pacasmayo	05/09/2015	100%	Agosto/2017	90 673,36
5	Trujillo	05/09/2015	100%	12/12/2016	1 058 172,65
6	Chimbote	21/09/2015	100%	17/11/2016	676 709,18
7	Huaraz	Nov./2016	100%	Noviembre/2017	207 517,62
Total					3 399 253,91


(*) Informe Quavii N° DGH-324 – 04 de abril del 2022. Actualizado al 02/04/2022.

MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL CONCESIÓN NORTE - NOVIEMBRE DE 2022

AVANCE DE LAS HABILITACIONES

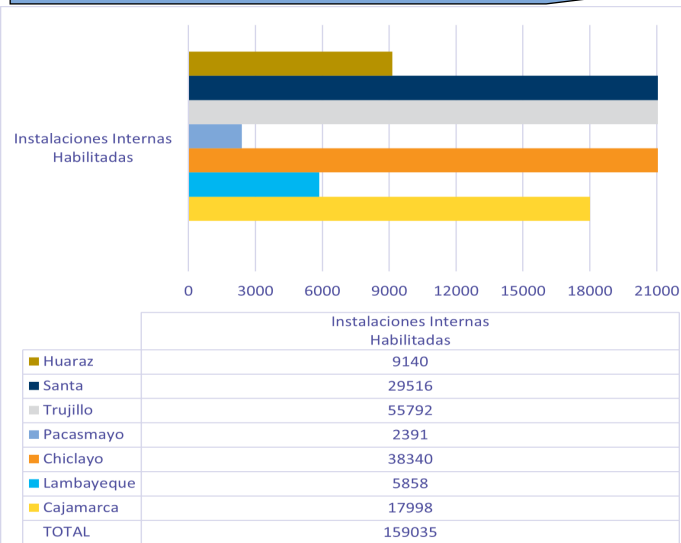

PLAN DE CONEXIONES

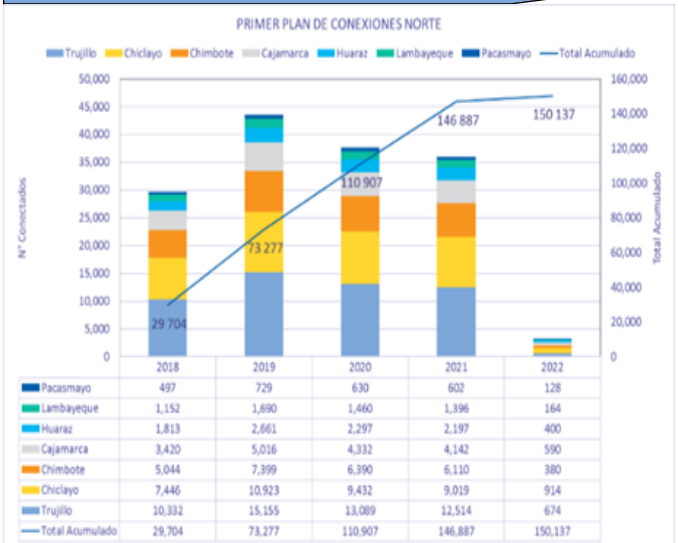

CONTRATOS DE SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN SUSCRITOS AL 31.10.2022

Provincia	Categoría	Cantidad
Trujillo	II	117
	III	3
	IV	6
	V	6
	VI	3
	VII	1
	GNV	2
Chimbote	II	45
	IV	1
	VII	2
	PESCA	25
Pacasmayo	GNV	1
	II	4
	V	1
Lambayeque	II	4
	III	2
	IV	2
	VI	1
	VII	4
Cajamarca	II	62
	III	4
	IV	1
	V	1
Chiclayo	II	29
	IV	1
	VII	1
	GNV	1
Huaraz	II	15
	III	3

Datos obtenidos del registro de contratos suscritos actualizado al mes de octubre de 2022 (Carta N° GDP-COM-S-2022-02679)

Marca	Modelo	Unidades	Estado
Chart Inc	LNG Trailer 52.8 TN 61.4 KL 7 Barg MAWP	11	Nacionalizado almacén GDP
	LNG Trailer 52.8 TN 63 KL 7 Barg MAWP	9	Nacionalizado almacén GDP
	LNG Trailer 52.8 TN 63 KL 7 Barg MAWP (con Bombas Criogénicas)	2	Nacionalizado almacén GDP
	LNG Trailer 52.8 TN 63 KL 7 Barg MAWP	2	Nacionalizado almacén GDP
HAM	LNG Trailer 25 TN 25 KL 19 Barg MAWP	2	Nacionalizado almacén GDP
	LNG Trailer 25 TN 25 KL 19 Barg MAWP + Dispensador GNL (Microfueler)	1	Nacionalizado almacén GDP
Chart Inc	LNG Trailer -52.8 TN 63 KL 7 Barg MAWP - Con Bomba Criogénica	8	Nacionalizado almacén GDP
Indox	Cisterna Criogenica 61.5 KL/7 Bar con Bomba Criogénica	5	Nacionalización

Informe Quavii N° DGH-324 – 02 de abril del 2022.

Póliza	# Póliza	Compañía	Vigencia	
			Inicio	Fin
Resp. civil	1201-540076	Rimac Seguros	01/06/2022	01/06/2023
Multiriesgo	1301-538501	Rimac Seguros	01/06/2022	01/06/2023
