
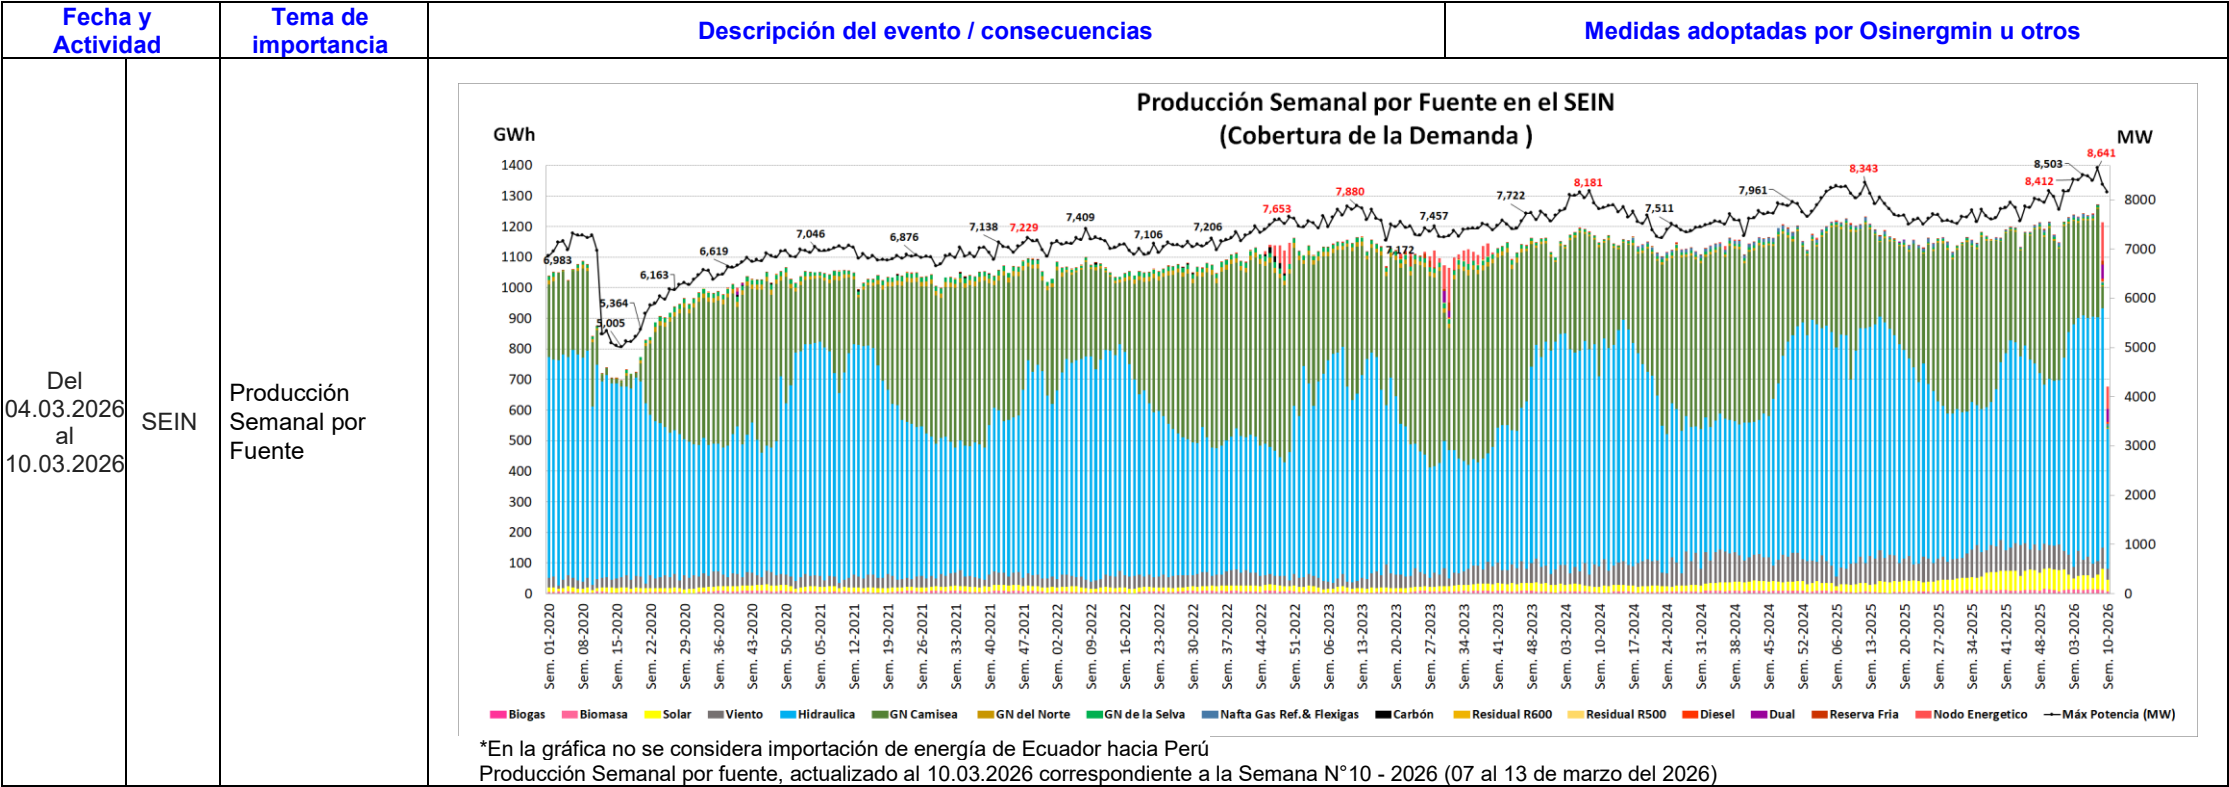
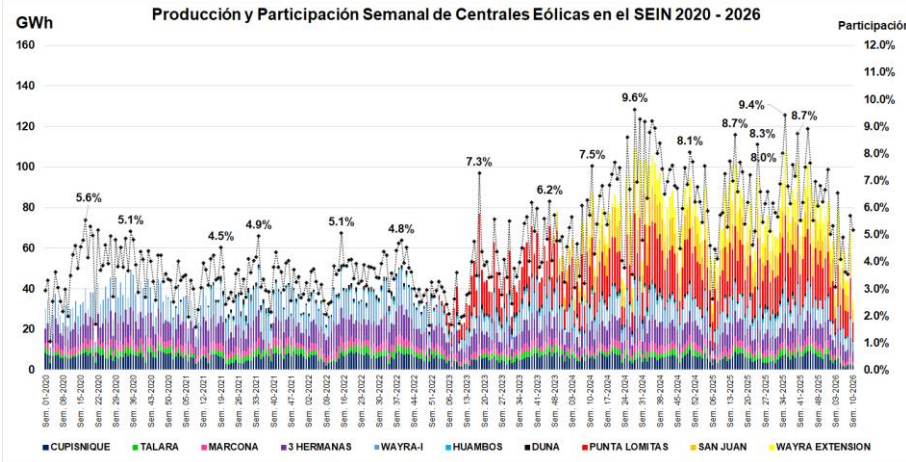


División de Supervisión de Electricidad

| Fecha y Actividad            |                     | Tema de importancia                                       | Descripción del evento / consecuencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medidas adoptadas por Osinergmin u otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |              |       |          |        |       |        |          |        |      |     |          |        |       |       |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------|----------|--------|-------|--------|----------|--------|------|-----|----------|--------|-------|-------|---------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.03.2026                   | G                   | Máxima Demanda del SEIN<br><br>OSINERGMIN                 | <p>A las 12:00 h del 10.03.2026, se registró la máxima demanda puntual del periodo reportado, siendo ésta <b>8,152.3 MW</b>. No supero los <b>8,641.1 MW</b> registrado el día 26.02.2026 como máxima demanda instantánea a nivel de generación.</p> <table><thead><tr><th>Zona</th><th>Máxima Demanda (MW)</th><th>Reserva Fria (MW)</th><th>Porcentaje %</th></tr></thead><tbody><tr><td>Norte</td><td>1,339.64</td><td>406.44</td><td>30.3%</td></tr><tr><td>Centro</td><td>4,951.52</td><td>375.98</td><td>7.6%</td></tr><tr><td>Sur</td><td>1,861.11</td><td>738.97</td><td>39.7%</td></tr><tr><td>Total</td><td>8,152.3</td><td>1,521.4</td><td>18.7%</td></tr></tbody></table> <p>Nota: La máxima demanda corresponde a la potencia de generación de los Integrantes del COES</p> | Zona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Máxima Demanda (MW) | Reserva Fria (MW) | Porcentaje % | Norte | 1,339.64 | 406.44 | 30.3% | Centro | 4,951.52 | 375.98 | 7.6% | Sur | 1,861.11 | 738.97 | 39.7% | Total | 8,152.3 | 1,521.4 | 18.7% | <div><div>MW</div><div>GWh</div><div>Máxima Demanda y Energía Acumulada Anual</div><div>(*) Máxima demanda puntual a nivel de generación registrada el día 28.03.2025 a las 14:30 horas.<br/>(**) Máxima demanda puntual a nivel de generación registrada el día 26.02.2026 a las 15:00 horas.</div></div> |
| Zona                         | Máxima Demanda (MW) | Reserva Fria (MW)                                         | Porcentaje %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |              |       |          |        |       |        |          |        |      |     |          |        |       |       |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Norte                        | 1,339.64            | 406.44                                                    | 30.3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |              |       |          |        |       |        |          |        |      |     |          |        |       |       |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Centro                       | 4,951.52            | 375.98                                                    | 7.6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |              |       |          |        |       |        |          |        |      |     |          |        |       |       |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sur                          | 1,861.11            | 738.97                                                    | 39.7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |              |       |          |        |       |        |          |        |      |     |          |        |       |       |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Total                        | 8,152.3             | 1,521.4                                                   | 18.7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |              |       |          |        |       |        |          |        |      |     |          |        |       |       |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Del 04.03.2026 al 10.03.2026 | G                   | Evolución de la Reserva Fria en el SEIN<br><br>OSINERGMIN | <div><div>MW</div><div>Reserva Fria del SEIN en Máxima Demanda<br/>(Periodo del 07.01.26 al 10.03.26)</div><div>Nota: Desde el 01.03.2026 las CCTT a GN de Camisea no se consideran a causa del siniestro en la estación de válvulas ubicada en el KP 43 en el distrito de Megantoni, región Cusco informado por TGP. No cuentan con GAS.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Durante el periodo reportado, se registraron los siguientes mantenimientos y/o indisponibilidades relevantes.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>C.T. VENTANILLA</b> (TG4: 150 MW): Del 04 al 10 de marzo, la unidad estuvo fuera de servicio por mantenimiento de transformador de potencia, mantenimiento de BESS e inspección mayor modificada más inspección menor de generador.</li><li>➤ <b>C.T. RF DE GENERACION TALARA</b> (TG5: 185 MW): Del 04 al 05 de marzo, la unidad estuvo fuera de servicio por Cambios de seguros y compresor axial.</li><li>➤ <b>C.T. LAS FLORES</b> (TG1: 211 MW): Del 06 al 10 de marzo, la unidad estuvo fuera de servicio por mantenimiento correctivo GCB TG.</li></ul> <p>De acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial N°158-2025-MINEM/DM, se fijó en <b>34.5%</b> como Margen de Reserva del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional para el <b>periodo mayo de 2025 hasta abril de 2026</b>.</p> |                     |                   |              |       |          |        |       |        |          |        |      |     |          |        |       |       |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Del 04.03.2026 al 10.03.2026 | SEIN                | Cobertura de la Demanda<br><br>OSINERGMIN                 | <p>Durante el periodo reportado, en base a datos puntuales, la cobertura de la demanda hasta el día 10.03.2026 se dio de la siguiente manera.</p> <div><div>MW</div><div>Cobertura de la Demanda del SEIN por Fuente<br/>(Del 04.03.26 - 10.03.26)</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>La energía producida (GWh) por tipo de fuente en el periodo reportado se distribuyó de la siguiente manera.</p> <div><div>Producción por Fuente de Energía<br/>(Del 04.03.26 - 10.03.26)</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |              |       |          |        |       |        |          |        |      |     |          |        |       |       |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

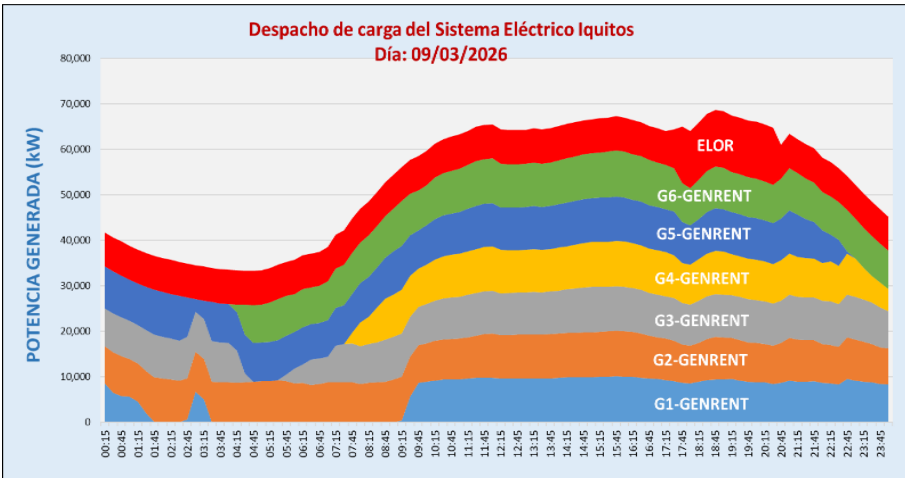

| Fecha y Actividad            |      | Tema de importancia                                                                | Descripción del evento / consecuencias                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Medidas adoptadas por Osinergmin u otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                          |                         |           |                      |      |        |            |               |      |        |            |
|------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|------|--------|------------|---------------|------|--------|------------|
| Del 04.03.2026 al 10.03.2026 | CE   | Generación y Participación de Centrales Eólicas en el SEIN                         |                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Puesta en Operación comercial de Centrales Eólicas en el 2024-2025</b></p> <table><tr><th>Central</th><th>Tensión de Conexión (Kv)</th><th>Potencia Instalada (MW)</th><th>Fecha POC</th></tr><tr><td>C.E. Wayra Extensión</td><td>33.0</td><td>177.00</td><td>29.06.2024</td></tr><tr><td>C.E. San Juan</td><td>33.0</td><td>135.70</td><td>14.12.2024</td></tr></table> | Central                 | Tensión de Conexión (Kv) | Potencia Instalada (MW) | Fecha POC | C.E. Wayra Extensión | 33.0 | 177.00 | 29.06.2024 | C.E. San Juan | 33.0 | 135.70 | 14.12.2024 |
|                              |      |                                                                                    | Central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tensión de Conexión (Kv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Potencia Instalada (MW) | Fecha POC                |                         |           |                      |      |        |            |               |      |        |            |
| C.E. Wayra Extensión         | 33.0 | 177.00                                                                             | 29.06.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                          |                         |           |                      |      |        |            |               |      |        |            |
| C.E. San Juan                | 33.0 | 135.70                                                                             | 14.12.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                          |                         |           |                      |      |        |            |               |      |        |            |
| Del 03.03.2026 al 09.03.2026 | GSA  | Situación Operativa del Sistema Eléctrico Aislado Iquitos<br><br><b>OSINERGMIN</b> | <p>El 09.03.2026, se registró la máxima demanda puntual del periodo reportado, siendo ésta <b>68.7 MW</b>. No ha superado los <b>74.8 MW</b> registrado el día 25.09.2024 como máxima demanda histórica instantánea a nivel de generación.</p>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                          |                         |           |                      |      |        |            |               |      |        |            |
|                              |      |                                                                                    | <p>Durante la máxima demanda del periodo semanal fue cubierta por 6 grupos (56.2 MW) de la CTIN de GENRENT, y 2 grupos (12.5 MW) de la CTI de ELOR.</p>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                          |                         |           |                      |      |        |            |               |      |        |            |

| Fecha y Actividad                 |      | Tema de importancia                                          | Descripción del evento / consecuencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Medidas adoptadas por Osinergmin u otros              |                      |                   |              |                         |    |              |    |                   |            |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------------|----|--------------|----|-------------------|------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del 04.03.2026 al 10.03.2026      | SEIN | Interrupciones importantes reportadas (Causas)               | <p>Las interrupciones importantes reportadas al Osinergmin en este periodo suman un total de 105.</p> <table><tr><th>Causas de las Interrupciones Importantes Reportadas</th><th>%</th></tr><tr><td>Varios Propio (1)</td><td>40</td></tr><tr><td>Fenómenos Naturales (2)</td><td>25</td></tr><tr><td>Terceros (3)</td><td>15</td></tr><tr><td>Mantenimiento (4)</td><td>15</td></tr><tr><td>Fallas Sistema Interconectado (5)</td><td>5</td></tr></table> <p>(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto).</p>                                                                                                                                                                         | Causas de las Interrupciones Importantes Reportadas   | %                    | Varios Propio (1) | 40           | Fenómenos Naturales (2) | 25 | Terceros (3) | 15 | Mantenimiento (4) | 15         | Fallas Sistema Interconectado (5) | 5 | <div><p><b>CAUSAS DE LAS INTERRUPCIONES IMPORTANTES REPORTADAS - P074</b></p><p><b>Total: 105 eventos de interrupciones reportados</b></p><p>1) Varios - Propio: Otros - Propio (31.4%, 33 veces, 10h 31' de duración), Corte de emergencia (6.7%, 7 veces, 14h 47' de duración), Falla equipo (1.9%, 2 veces, 16h 39' de duración).<br/>2) Fenómenos naturales: Otros - Fen. Nat. (11.6%, 12 veces, 22h 18' de duración), Descargas atmosféricas (10.5%, 11 veces, 11h 13' de duración), Fuertes vientos (2.9%, 3 veces, 3h 37' de duración).<br/>3) Terceros: Aves (1.9%, 2 veces, 2h 3' de duración), Impacto vehicular (1.9%, 2 veces, 1h 1' de duración), Vandalismo (1%, 1 vez, 1h 23' de duración), Contacto accidental con línea (1%, 1 vez, 1h 8' de duración), Otros - Terceros (9.2%, 10 veces, 16h 29' de duración).<br/>4) Mantenimiento: Mantenimiento - Propio (10.2%, 11 veces, 5h 29' de duración), Expansión o reforzamiento de redes - Propio (2.9%, 3 veces, 6h 48' de duración), 0.<br/>5) Fallas Sistema Interconectado: (Recomponer la carga) (0%, 0 veces, de duración), Otros - Otras E.E (1.9%, 2 veces, 1h 55' de duración), Déficit de generación (3.1%, 3 veces, 58' de duración).</p></div> |
|                                   |      | Causas de las Interrupciones Importantes Reportadas          | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                      |                   |              |                         |    |              |    |                   |            |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Varios Propio (1)                 | 40   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                      |                   |              |                         |    |              |    |                   |            |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fenómenos Naturales (2)           | 25   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                      |                   |              |                         |    |              |    |                   |            |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Terceros (3)                      | 15   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                      |                   |              |                         |    |              |    |                   |            |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mantenimiento (4)                 | 15   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                      |                   |              |                         |    |              |    |                   |            |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fallas Sistema Interconectado (5) | 5    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                      |                   |              |                         |    |              |    |                   |            |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OSINERGMIN                        |      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                      |                   |              |                         |    |              |    |                   |            |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Del 04.03.2026 al 10.03.2026      | SEIN | Interrupciones importantes reportadas (Instalación Causante) | <p>Las <b>interrupciones importantes (*)</b> reportadas al Osinergmin por instalación causante se muestran en el cuadro siguiente.</p> <table><tr><th>Origen de las Interrupciones por instalación causante</th><th>N° de Interrupciones</th><th>% de Interrupción</th></tr><tr><td>Distribución</td><td>83</td><td>79</td></tr><tr><td>Transmisión</td><td>17</td><td>16</td></tr><tr><td>Generación</td><td>5</td><td>5</td></tr></table> <p>(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto).<br/>(*) Se consideran como importantes cuando ocasionan interrupciones a usuarios regulados por un tiempo mayor o igual a cuatro horas, o cuando se interrumpe más de 10 000 usuarios.</p> | Origen de las Interrupciones por instalación causante | N° de Interrupciones | % de Interrupción | Distribución | 83                      | 79 | Transmisión  | 17 | 16                | Generación | 5                                 | 5 | <div><p><b>ORIGEN DE LAS INTERRUPCIONES IMPORTANTES POR INSTALACIÓN CAUSANTE</b></p><p><b>Total: 105 eventos de interrupciones reportados</b></p><p>(1) Distribución: Causas internas (53%, 44 veces, 5d 13h 56' de duración), Fenómenos naturales (25.3%, 21 veces, 2d 12h 17' de duración), Terceros (18.1%, 15 veces, 21h 7' de duración), Otros suministradores (3.6%, 3 veces, 1h 50' de duración).<br/>(2) Transmisión: Causas internas (52.9%, 9 veces, 1d 5h 19' de duración), Fenómenos naturales (29.4%, 5 veces, 51' de duración), Terceros (5.9%, 1 vez, 57' de duración), Otros suministradores (11.8%, 2 veces, 6h 9' de duración).<br/>(3) Generación: Causas internas (60%, 3 veces, 10h 59' de duración), Otros suministradores (40%, 2 veces, 55' de duración).</p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   |      | Origen de las Interrupciones por instalación causante        | N° de Interrupciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | % de Interrupción                                     |                      |                   |              |                         |    |              |    |                   |            |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Distribución                      | 83   | 79                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                      |                   |              |                         |    |              |    |                   |            |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Transmisión                       | 17   | 16                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                      |                   |              |                         |    |              |    |                   |            |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Generación                        | 5    | 5                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                      |                   |              |                         |    |              |    |                   |            |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OSINERGMIN                        |      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                      |                   |              |                         |    |              |    |                   |            |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Fecha y Actividad            |   | Tema de importancia                                                                                      | Descripción del evento / consecuencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Medidas adoptadas por Osinergmin u otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del 05.03.2026 al 12.03.2026 | G | <b>Supervisión del Contrato:</b><br>C.S.F. Sunny-309 MW<br><br><b>Empresa:</b><br>KALLPA GENERACIÓN S.A. | <ul style="list-style-type: none"><li>El proyecto se encuentra ubicado en el departamento y provincia de Arequipa, distrito La Joya.</li><li>La C.S.F. Sunny tiene una potencia instalada total de 309 MW. El Proyecto se ha dividido en dos (2) etapas: i) CSF Sunny con 204 MW (Etapa 1) y ii) CSF Sunny Expansión con 105 MW (Etapa 2), se ubica en el distrito La Joya, provincia y departamento de Arequipa. La conexión al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) será mediante la S.E. San José de 220 kV con una distancia de 1,4 km.</li><li>El 22.02.2023, con R.M. N° 054-2023-MINEM/DM, el MINEM otorgó a la empresa Kallpa Generación S.A. la Concesión Definitiva de generación eléctrica con Recursos Energéticos Renovables para su proyecto Central Solar Fotovoltaica Sunny, con una potencia instalada de 204 MW.</li><li>El 23.02.2023, se suscribió el Contrato de Concesión N° 591-2023 entre el Ministerio de Energía y Minas y Kallpa Generación S.A.</li><li>El 16.06.2025, con R.M. N° 203-2025-MINEM/DM, el MINEM aprobó la Adenda N° 2 donde se incrementó la potencia nominal de 204 MW a 309 MW y la inclusión de una segunda etapa estableciendo su POC hasta el 27.08.2026.</li><li>El 06.10.2025, con R.M. N° 320-2025-MINEM/DM, el MINEM establece con carácter permanente la servidumbre de paso y tránsito a favor de Concesión definitiva de generación de energía eléctrica de la que es titular la empresa Central Solar Fotovoltaica Sunny.</li><li>El 17.10.2025, con Carta N° COES/D/DP-989-2025, el COES aprobó la integración al SEIN de la C.S.F. Sunny de 204 MW conformada por 37 1040 módulos fotovoltaicos y 750 inversores fotovoltaicos.</li><li>El 20.10.2025, con Carta N° COES/D/DP-998-2025, el COES aprobó la Operación Comercial de la central a partir de las 00:00 horas del 22.10.2025, con una Potencia Nominal de 204 MW. (Etapa 1-concluido).</li><li>Se encuentra pendiente el ingreso a Operación Comercial de 105 MW correspondientes a la Etapa 2, necesarios para cumplir contractualmente con los 309 MW de potencia nominal. Dicho ingreso está previsto para el 27.08.2026.</li><li>El proyecto presenta en la Etapa 1: Avance Global: 100%, Avance Físico: 100%, con fecha POC 22.10.2025.</li><li>La Etapa 2: Avance Físico: 96,5%.</li><li>El 05.02.2026 con Carta N° COES/D/DP-077-2026 se da la autorización de conexión para las pruebas de puesta en servicio del proyecto “C.S.F. Sunny expansión de 105 MW (Etapa 2), que comprende la energización del transformador de potencia TP-F03 de tres devanados 220/33/33 kV, 150/75/75 MVA y la conexión de la C.S.F. Sunny Expansión de 105 MW.</li><li>El 11.02.2026, se energizó por primera vez el transformador TP-F03 de la C.S.F. Sunny.</li><li>El 12.03.2026 con Carta N° COES/D/DP-156-2026, el COES aprobó la integración al SEIN desde las 00:00 horas del 13.03.2026 de las Instalaciones de Transmisión del Proyecto (Transformador de potencia TP - F03 de 220/33/33 kV de 150 /75/75 MVA (ONAF) y sus respectivas celdas).</li><li>La POC para la Etapa 2 según cronograma vigente, está prevista para el 27.08.2026.</li><li>El monto de inversión será de US\$ 233 millones, según lo informado por la Concesionaria.</li></ul> |  <p>28 ene. 2026 16:11:07<br/>Arequipa 04405<br/>Perú<br/>16 68853137S 71 81437195W<br/>Altitud:1451.6m</p> <p><b>Paneles Solares</b></p>  <p>28 ene. 2026 16:10:19<br/>Arequipa 04405<br/>Perú<br/>16 68846682S 71 81435798W<br/>Altitud:1455.6m</p> <p><b>Vista de los robots</b></p> |
|                              |   |                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>El proyecto se encuentra ubicado en los distritos de Padre Abad y Rupa Rupa, provincias de Padre Abad y Leoncio Prado, departamentos de Ucayali y Huánuco. Tiene como objetivo mejorar la confiabilidad en la zona de Aguaytía y Pucallpa, la nueva S.E. Leoncio Prado permitirá el desarrollo de la subtransmisión de la zona y resolverá las limitaciones de la S.E. Tingo María existente.</li><li>El proyecto contempla la construcción del Enlace 220 kV Tingo María - Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociada, el cual tendrá una longitud de 73 km y será de simple terna.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Fecha y Actividad            |  | Tema de importancia | Descripción del evento / consecuencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Medidas adoptadas por Osinergmin u otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del 05.03.2026 al 12.03.2026 |  | T                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Con R.M. N° 275-2024-MINEM/DM del 18.07.2024, el MINEM aprobó la suspensión de plazo por 217 días calendario, siendo la nueva fecha POC el 28.07.2024.</li> <li>El 27.07.2024, con R.M. N° 298-2024-MINEM/DM, el MINEM otorgó la concesión definitiva para el proyecto.</li> <li>El 16.10.2024, CLTLN comunicó al MINEM la existencia de una controversia (debido a la inexistencia del punto de conexión requerido para que el proyecto se integre al SEIN) y dan inicio a un trato directo nacional. El 30.01.2025, CLTLN y el MINEM suscribieron el acta de cierre del Trato Directo, donde las partes declaran no haber llegado a acuerdos de los puntos controvertidos.</li> <li>La ingeniería de detalle se mantiene con un avance de 98,9%, según lo informado por la empresa supervisora DESSAU S&amp;Z.</li> <li>En la S.E. Leoncio Prado y en la S.E. Tingo María está pendiente la llegada a obra de los tableros de respaldo satelital y de los tableros de telecomunicaciones del MTC. Está pendiente la reubicación de la trampa de onda de la S.E. Tingo María hacia la S.E. Leoncio Prado. En la L.T. se montaron 125 estructuras de un total de 148. No se ha iniciado el tendido de conductor.</li> <li>Se mantiene un total de 30 torres con problemas de servidumbre, de las cuales: en 15 torres no se iniciaron ni las obras civiles y en 15 torres (ya montadas o con montaje iniciado) se tiene el acceso bloqueado para la continuación de su montaje o revisión.</li> <li>Applus informó que las obras civiles y electromecánicas en las S.E. Leoncio Prado, S.E. Aguaytía y L.T. Leoncio Prado – Aguaytía están suspendidas desde el 30.10.2024. Durante los meses de enero y febrero 2025 se realizaron actividades en la L.T. de 22,9 kV (970 metros), donde está pendiente la llegada del medidor electrónico multifunción.</li> <li>Applus reiteró que está pendiente la instalación de cinco Piezómetros del Tipo Casagrande en la S.E. Leoncio Prado (3 piezómetros instalados en los taludes y 2 piezómetros instalados en la plataforma de la subestación) y la finalización del levantamiento de observaciones.</li> <li>El 30.12.2025, con carta COES/D/DP-1205-2025, el COES dio conformidad al Estudio de Pre Operatividad para la conexión al SEIN.</li> <li>El 31.12.2025, se solicitó al COES el alcance del EO, lo cual fue atendido el 12.01.2026 por el COES, mediante su Plataforma Interactiva de Proyectos. Actualmente, el EO se encuentra en elaboración y se presentará al COES luego de la aprobación del EO de YANA.</li> <li>El 20.02.2025, CLTLN presentó al MINEM 275 expedientes de servidumbre, de las cuales 36 son de establecimiento forzoso o imposición (16 en torres y 20 en vanos). El MINEM comunicó 12 observaciones, siendo una de ellas referida a que el trazo ejecutado difiere de la Concesión Definitiva. Mediante R.D. N° 0015-2026-MINEM-DGE del 16.02.2026, el MINEM declaró inadmisibles las solicitudes de establecimiento de servidumbre.</li> <li>CLTLN informó que, en febrero, su personal realizó el recorrido de la LT, para verificar accesos, servidumbres, condiciones de campo, etc.</li> <li>El 21.01.2026, CLTLN solicitó al MINEM la modificación de la Concesión Definitiva, la cual se formuló en atención a la necesidad de actualizar aspectos técnicos de la servidumbre. El 26.02.2026, con Oficio N° 0417-2026-MINEM/DGE, el MINEM admitió a trámite la modificación de la Concesión Definitiva. El 05 y 06.03.2026, CLTLN realizó las publicaciones respectivas en los diarios de mayor circulación.</li> <li>A finales de marzo, CLTLN espera iniciar la movilización para la construcción de 15 torres (desde cimentaciones) y 24 torres para terminar el montaje. En abril se podrían reiniciar las actividades.</li> <li>El avance global del proyecto se mantiene en 89,4%. <ul style="list-style-type: none"> <li>Avance L.T.: 77,2%. Avance S.E.s: 97,6%. Avance L.T. SS.AA.: 95,0%.</li> </ul> </li> <li>A la fecha, se han ejecutado US\$ 20,1 millones de un total de US\$ 33,1 millones previstos</li> </ul> | <div>  <p>Vista panorámica de la S.E. Leoncio Prado</p> </div> <div>  <p>Vista panorámica de la S.E. Aguaytía</p> </div> <div>  <p>P-01 y P-15 de la LT 22,9 kV de Servicios Auxiliares</p> </div> |

| Fecha y Actividad |                                                    | Tema de importancia                                                                                                                                                          | Descripción del evento / consecuencias                                                  |                 |               |                           | Medidas adoptadas por Osinergmin u otros |                               |      |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------|
|                   |                                                    |                                                                                                                                                                              | por la Concesionaria para la construcción y Puesta en Operación Comercial del proyecto. |                 |               |                           |                                          |                               |      |
| SEIN<br>G/T       | Próximos<br>Proyectos a<br>Ingresar en<br>Servicio | PROYECTOS PRÓXIMOS A INGRESAR EN OPERACIÓN COMERCIAL                                                                                                                         |                                                                                         |                 |               |                           |                                          |                               |      |
|                   |                                                    | Proyecto                                                                                                                                                                     | Concesionaria                                                                           | Tipo de Central | Potencia (MW) | Inversión (US\$ millones) | Avance global                            | Puesta En Operación Comercial | Tipo |
|                   |                                                    | C.S.F. Sunny                                                                                                                                                                 | KALLPA GENERACIÓN S.A.                                                                  | CSF             | 309           | 149.6                     | 96.5%                                    | 27.08.2026                    | N.C  |
|                   |                                                    | C.S.F. Illa                                                                                                                                                                  | ENERGÍA RENOVABLE LA JOYA S.A.                                                          | CSF             | 385           | 335                       | 85%                                      | 31.03.2027 (*)                | N.C  |
|                   |                                                    | P.E. Caravelí                                                                                                                                                                | IBEROLICA CARAVELI S.A.C                                                                | P.E.            | 219,6         | 165,6                     | 74,2%                                    | 13.03.2027                    | N.C  |
|                   |                                                    | C.S.F. San José                                                                                                                                                              | ACCIONA ENERGÍA PERÚ                                                                    | CSF             | 155,7         | 79,8                      | 43,6%                                    | 31.12.2026                    | N.C  |
|                   |                                                    | C.S.F. Solimana                                                                                                                                                              | ECORER S.A.C.                                                                           | CSF             | 250           | 149.5                     | 3,2%                                     | 02.04.2027                    | N.C  |
|                   |                                                    | C.S.F. Hanaqpampa                                                                                                                                                            | ENGIE ENERGIA PERU                                                                      | CSF             | 300           | 271.9                     | 0,1%                                     | 30.12.2026                    | N.C  |
|                   |                                                    | (*) La POC contractual estaba prevista para el 31.12.2025, no se cumplió, la Empresa Energía Renovable La Joya S.A. solicitó ampliación de plazo de POC hasta el 31.03.2027. |                                                                                         |                 |               |                           |                                          |                               |      |

G: Generación, GSA: Sistemas Aislados, T: Transmisión, C: Comercial, D: Distribución, CT: Central Térmica, CH: Central Hidráulica, CE: Central Eólica, CSF: Central Solar, RF: Reserva Fría, SE: Subestación, CL: Cliente Libre, C: Convencional, N.C: No convencional, L: Legal, P: Projectado  
Fecha: 13.03.2026
